

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 8 города Ельца»

**«Оптимизация процесса замены отсутствующего
учителя в условиях работы
двух корпусов»**

Сроки реализации:
02.09.2024 – 29.11.2024

Елец, 2024 год

Карточка проекта «Оптимизация процесса замены отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Краюшкина Е.Ю., директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»

Название процесса: замена отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов

Границы процесса: от обращения к заместителю директора по корректировке расписания до доведения изменений в расписании до сведения участников образовательных отношений.

Руководитель проекта: Соломенцева Т.А., заместитель директора

Владелец проекта: Соломенцева Т.А., заместитель директора

Команда проекта: Курасова Н.А., Серегина М.В., Сыромятова Е.А., Харламова Т.В. заместители директора

2. Обоснование выбора проекта

Необходимость своевременной замены отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов школы для повышения эффективности и сокращения временных задержек.

Риски:

- реализация основной образовательной программы не в полном объеме в связи с несвоевременной заменой отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на составление замены	100 мин	20 мин
Сокращение времени на оповещение учителей и обучающихся об изменениях в расписании	30 мин	7 мин

Эффекты:

1. Сокращение времени на замену отсутствующего учителя.
2. Разработка единого алгоритма действий при осуществлении замены отсутствующих учителей.
3. Своевременное оповещение участников образовательного процесса об изменении расписания.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – утверждение команды по реализации проекта (02.09.2024 г.)

2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса (03.09.24 – 01.10.2024 г.):


- разработка текущей карты процесса (03.09 – 06.09.2024 г.);
- поиск и выявление проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации (09.09 – 13.09.2024 г.);
- разработка целевой карты процесса (16.09 – 20.09.2024 г.);
- разработка «Дорожной карты» реализации проекта (23.09-04.10.2024 г.).

3. Реализация мероприятий «Дорожной карты» (07.10 – 25.10.2024 г.)

4. Анализ и устранение ошибок (28.10 – 02.11.2024)

5. Закрепление результатов и закрытие проекта (05.11- 29.11.2024 г.)

Пирамида проблем

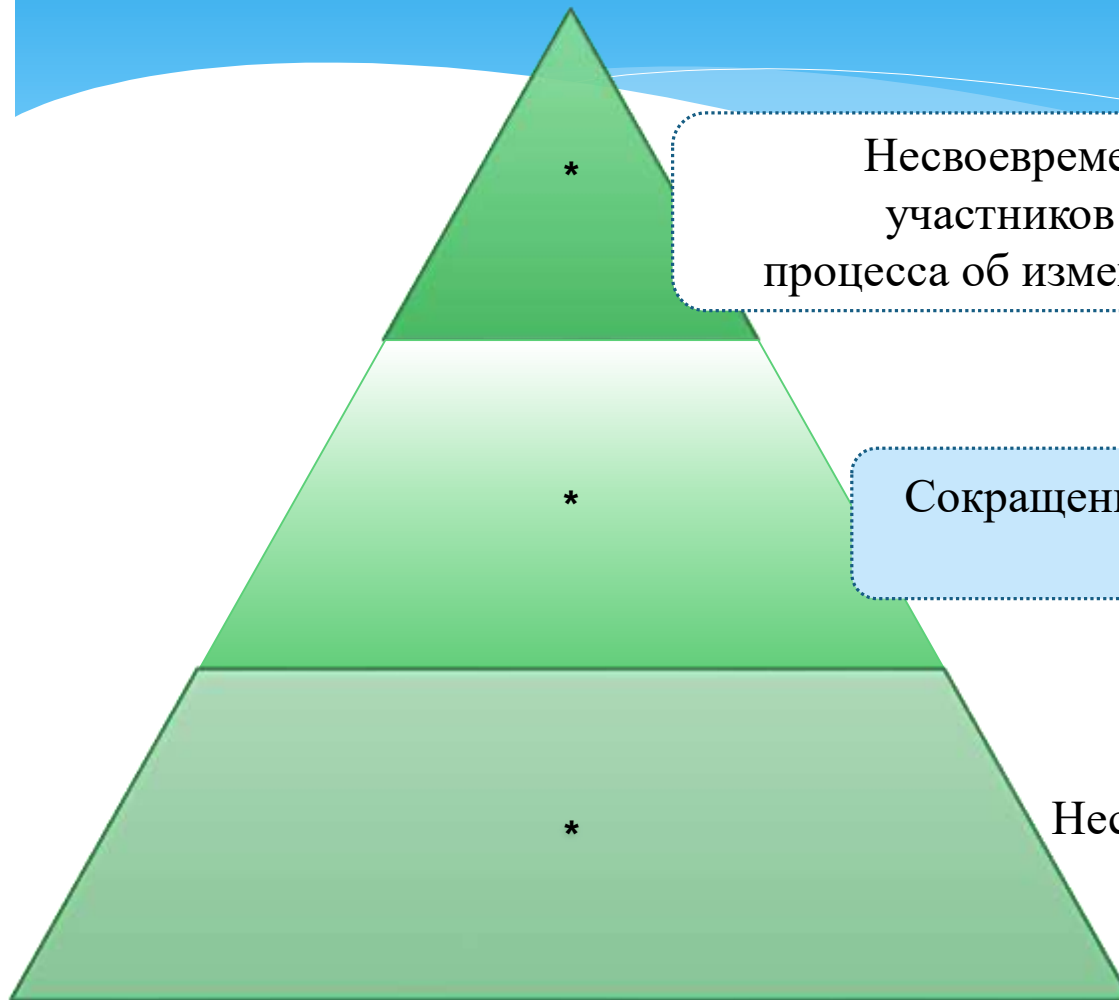


Несвоевременное оповещение
участников образовательного
процесса об изменении расписания

Сокращение дублирующих
действий

Несовершенство действий при
осуществлении замены
отсутствующих учителей

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса замены отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов»

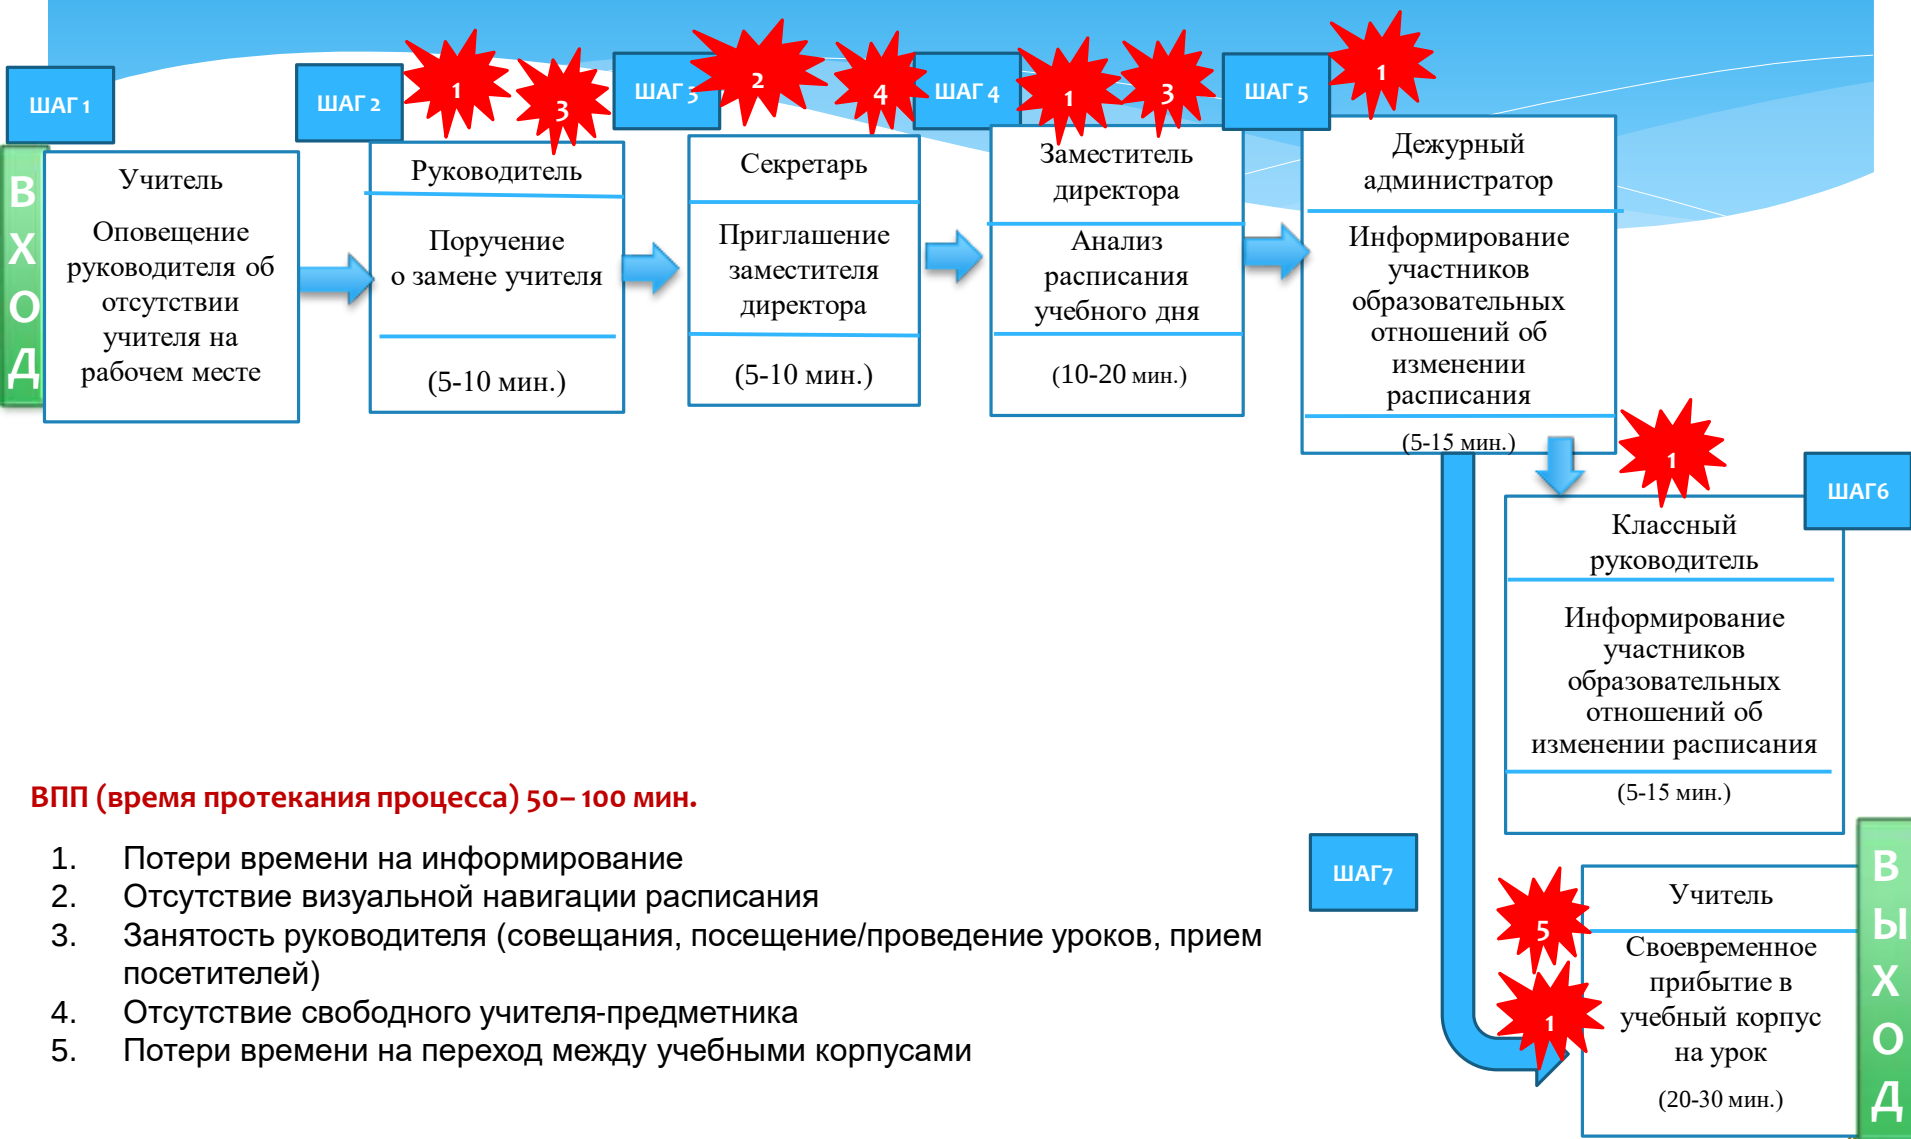


Анализ проблем, разработка решений

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Потери времени на информирование	Создание группы учителей в мессенджере Сферум	до 30 мин
Занятость руководителя		
Отсутствие визуальной навигации расписания	Создание навигации расписания по ШМО учителей-предметников, по занятости в учебных корпусах, по классам. Работа в программе Электронное расписание	до 18 мин
Отсутствие свободного учителя-предметника	Изменение последовательности уроков	
Потери времени на переход между учебными корпусами	Изменение последовательности уроков	10 мин.

Карта идеального состояния процесса

«Оптимизация процесса замены отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов»

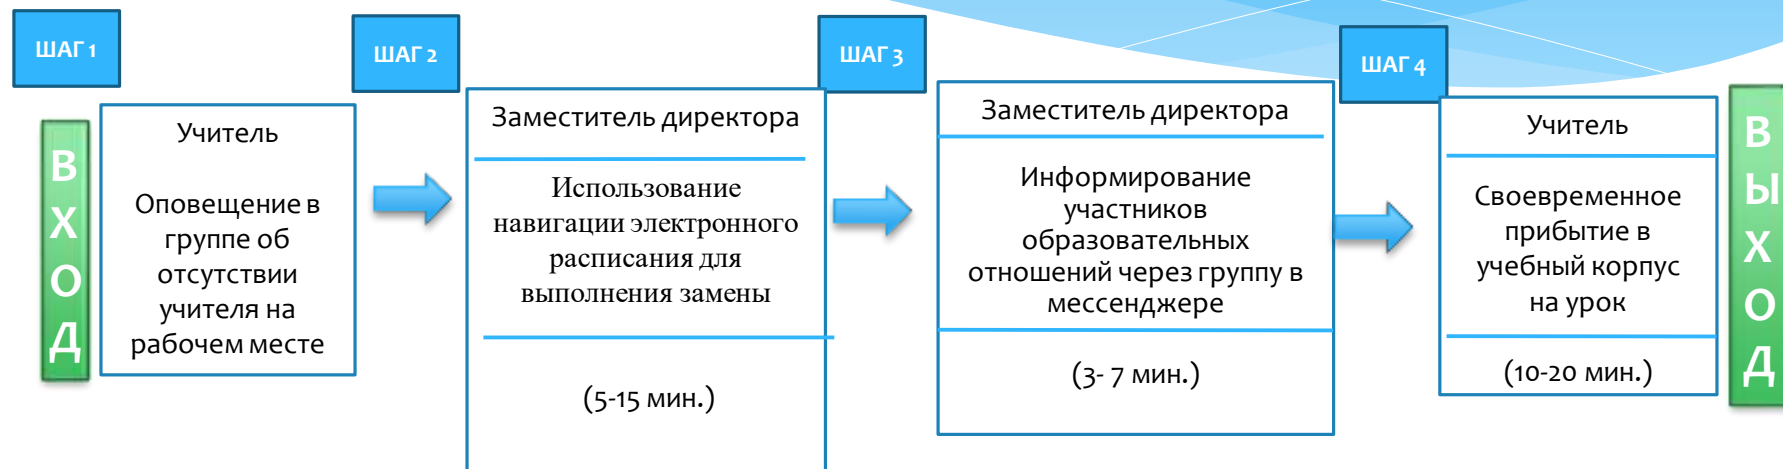

ВПП (время протекания процесса) 18 -42 мин.
Сокращение времени от 32 до 58 минут.
Сокращено 3 дублирующих действия.

Дорожная карта по оптимизации процесса «Оптимизация процесса замены отсутствующего учителя в условиях работы двух корпусов»

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя
1.	Потери времени на информирование работника	Отсутствие системы быстрого оповещения работников	Обеспечение быстрого доступа к контактной информации учителей. Передача материалов по электронным формам связи	Фотоотчет. Скриншот созданной группы учителей школы	Харламова Т.В., заместитель директора Серегина М.В., заместитель директора
2.	Занятость руководителя	Производственная занятость	Передача материалов по электронным формам связи	Скриншот созданной группы учителей школы	Соломенцева Т.А., зам. директора Сыромятова Е.А., зам. директор
3.	Отсутствие свободного учителя-предметника	Занятость учителей в учебном процессе	Корректировка последовательности уроков в электронном расписании	Оповещение в группе	Соломенцева Т.А., Курасова Н.А., зам. директора
4.	Потери времени на переход между учебными корпусами	Удаленность учебных корпусов	Привлечение учителей, работающих в данном корпусе	Расписание	Соломенцева Т.А., Курасова Н.А., зам. директора



Учительская - рабочая

48 участников



Позвонить



Включено



Еще



<https://sferum.ru/?p=messages&j...>



Участники 48



Фотографии



Видео



Поиск



Добавить участников



МБОУ "СШ № 8 г.Ельца" ★

сообщество



Краюшкина Елена Юрьевна ★

заходила 20 минут назад



Селемешова Татьяна Александровна

Расписание

46 участников

Позвонить

Включено

Еще

<https://sferum.ru/?p=m...>

Участники 46

Фотографии

+

Добавить участников

Соломенцева Татьяна А...

online

Ажиркова Ольга Влади...

заходила недавно

Расписание

46 участников

Изменения расписания на 08.10.2024 вторник

Урок	3В	Кабинет	Учитель	4В	Кабинет	Учитель
1(12.30)	Искз	4/35*	Савина/Николаева	Чтение	26	Ко
2	Математика	4	Николаева	Математика	26	Ко
3	Русский	4	Николаева	Русский	26	Ко
4	Чтение	4	Николаева	Труд	26	В
5	Физкультура					
1А вакансия кураторской группы в ГПД с 12.30 в кабинете 3						
Урок	5В	Кабинет	Учитель	6В		
1				4. Искз	26*/7	Сав
2				5. Литература	6	
3				6. —		
4				7. —		
5	Информатика	20/ —	Горбушина / —	8. —		
6				9. —		
7А						
1	ИЗО	26	Скородина	Музыка	6 (5А в 26)	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
7В						
1	Информатика	20/ —	Горбушина / —	Информатика	20/ —	Га
2				Алгебра	20	
3						
4						
5						
6						
7						
9В						
1						
2						
3						
4	Литература	23	Кураева			
5						
6	Информатика	20/ —	Горбушина / —			
7						
10						
1						
2						
3				Искз	34/40	
4	Биология	28	Савина/Николаева	Алгебра	28/20	Е
5						
6						
7				Химия	—	

13:20

М ХроноГраф 3.0 Мастер - "два корпуса" - [Составление расписания]

Проект Правка Экраны Действия Отчеты Помощь



№	Препо.	ПМК	Нагр.	Понедельник								Вторник								Среда								Четверг								Пятница							
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	
1	Мигунова К.	Рус.яз	24/24	8Б	8Б	6А			6Б			6А	6Б	6А	6Б			6А	6Б	8Б	6А	8Б	6Б			6А		6Б	6А		6А		6Б	8Б	6Б	6А		6Б	8Б				
2	Степаненко	Рус.яз	25/25	11А	8А	11А	7А		9А			8А	7А	8А		11А			7А	9А		11А	9А			7А	8А	11А	9А	8А	11А		9А	7А	7А	7А	9А	8А					
3	Черникова	Рус.яз	21/21	5Б	5Б		5А	5А			5А			5Б	6Б	5Б		5А		5А		5Б	5Б			5Б	6Б		5А	5А			5А	5А		5Б	6Б	5Б					
4	Черных С.А.	Рус.яз	28/28	7Б	5Б	5Б		9Б	9Б		7Б	9Б	7Б	5Б	5Б	10А	9Б	7Б		10А	5Б	10А	9Б			5Б	5Б		7Б	10А	5Б		9Б	7Б	10А	7Б	10А	5Б					
5	Ершова И.А.	Ист	32/32		7А	8Б	7Б	8А	8Б	10А	9Б	10А		7А	8А	8Б			10А		8А	9Б	5Б	7Б		7Б		5А	9Б		7А	10А	5Б	10А	5А	8А	9Б	8Б	10А				
6	Сыромятова	Ист	26/26	9А		9А	11А	11А	6А		11А	10А	9А	6Б				11А	6А		10А	11А			11А		10А	6Б	6А	11А			11А	9А	11А	6Б		10А	11А				
7	Ажаркова О	Матем	45/45	10А	11А	5А	5Б	8Б	10А		8Б	5А	10А	11А	8Б		10А		10А	8Б	5Б		5Б		11А	5А	11А	5А	10А	8Б	8Б	10А		10А	5Б		5А	5Б	11А				
8	Кобзева Н.А	Матем	33/33	8А	11А	8А	9Б	6А	11А		6А	8А	6А	11А	9Б			8А	11А	9Б	9Б			11А		11А	6А	8А		9Б			6А	8А	9Б		11А	11А					
9	Романова	Матем	28/28	7А	7Б	6Б	9А	7А	10А		9А	9А	10А	7Б	7А	6Б		10А	7А			7А	7Б	9А		6Б	7Б	7А	6Б	9А	10А		10А	6Б	7Б		7Б		9А				
10				5А	6Б	7А	8Б				4Б	3А	2Б		5А	11А		5А	5А		7А	6Б	11А			9А	3А	2Б	4Б	6Б	8Б		7А	11А	8Б			9А					
11	Сергина М.	ИН.яз	24/24	5Б	6А	7А	8А				4А	3Б	2А	10А	5Б			9А	5Б		7А	6А	10А			9А	3Б	2А	4А	6А	8А		7А		8А	10А		9А					
12	Ускова И.Ю.	ИН.яз	36/36	5А	6А	7Б	8А				4А	3А	2А		5А			9Б	5А		7Б	6А				9Б	3А	2А	4А	6А	8А		7Б		8А			9Б					
13				5А	6А	7А	8А				4А	3А	2А	10А	5А	11А		5А	5А		7А	6А	11А	10А		9А	3А	2А	4А	6А	8А		7А	11А	8А	10А		9А					
14	Горбунова Е.	Инфор	23/23	6А		10А		11А	5А		7Б	8Б	6Б	9Б	5Б			6Б			10А	11А	8А	8Б		10А		5Б	11А	7Б	9Б				11А	9А	7А	10А					
15	Солоненцев	Инфор	24/24	6А		10А		7Б	5А		7Б	8Б	6Б	9Б	5Б			6Б		7А			8А	8Б			7А	5Б	7Б	7Б	9Б	11А				9А	7А						

М ХроноГраф 3.0 Мастер - "два корпуса" - [Назначение замен]

Проект Экраны Действия Перенос данных Отчеты Помощь



 Свободные от занятий, ведущие тот же предмет в той же параллели(1) 			 01.10.2024 		     					
Заменяемый препод.			Вторник, 01.10.2024							
			1	2	3	4	5	6	7	8
	Степаненко	Рус.яз	29 8А Рус.яз	29 7А Рус.яз	29 8А Рус.яз		29 11А Литерат			
№	Препод.	Предм								
1	Мигунова К.	Рус.яз		31 6А Рус.яз	31 6Б Рус.яз	31 6А Литерат	26 6Б Рус.яз			

Предварительные итоги проекта

1. Сокращены потери времени на информирование участников образовательных отношений
2. Сокращены дублирующие действия
3. Используется программа Электронное расписание

Спасибо за внимание!
